


Объект мероприятий – Аварийный ремонт плиты перекрытия, возникший в 2017 году в виду расслоения арматуры и падения лопнувшей части плиты перекрытия. Причина – протекание в зимний период въездной части перекрытия ГСК.

Источник финансирования – выделение средств из планового бюджета на запуск терминала по сбору платежей – сдвиг запуска.

Источник появления заявки – словесная заявка собственника БОКСА № 193, обнаружившего аварию плиты перекрытия.

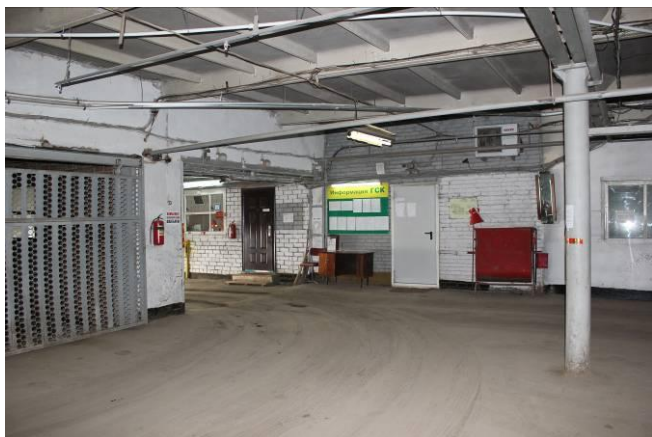

Было до ремонта



Расслоение плиты, обрушение потолка, гниение арматуры из за протекания



Демонтаж обломков и сварка арматуры с каркасом из несъемной опалубки



Армирование монолита плиты



Вид снизу готовой заливки



Бетонирование плиты подрядчиком



Асфальтирование подрядчиком
